

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE NALOGE PEČAR - KERAMIK



NAČRTOVANJE	točke	
	predvidene	pridobljene
<i>Pristop in priprava na delo</i> (osebna oprema, orodje, urejenost delavnega mesta)	5	
<i>Razumevanje dokumentacije in izdelava naloge</i> (razvidno iz končnega izdelka)	5	
<i>Prenos oblike naloge iz delovne skice na delovno površino</i>	15	

STROKOVNOST	točke	
	predvidene	pridobljene
<i>Ravnost izdelane površine</i> (debelina nanosa lepila, višinska razlika površine)	10	
<i>Ravnost in enakomernost fug - širina</i> (vertikala, horizontala, globina, enotna po vseh detajlih)	10	
<i>Točnost mer</i> (širina, višina, pravokotnost, širina odreza, diagonala)	10	
<i>Izgled rezanih robov</i> (mere, čistost odreza)	15	
<i>Izgled, uporabnost naloge</i> (vizualni izgled naloge, čistoča)	15	
<i>Čas izdelave naloge</i>	5	
<i>Porabljeni material</i> (največ 30 % več)	15	
<i>Skupaj:</i>	105	




GRADBENIADA NOVO MESTO 2011

NALOGA - KERAMIKI

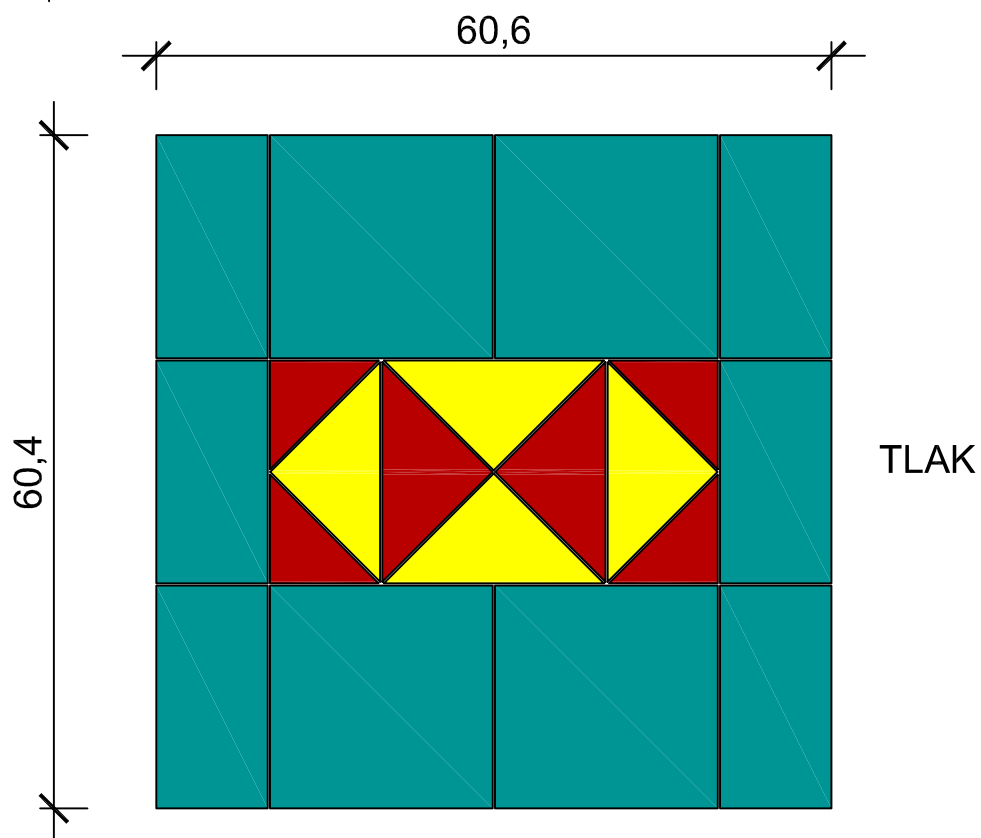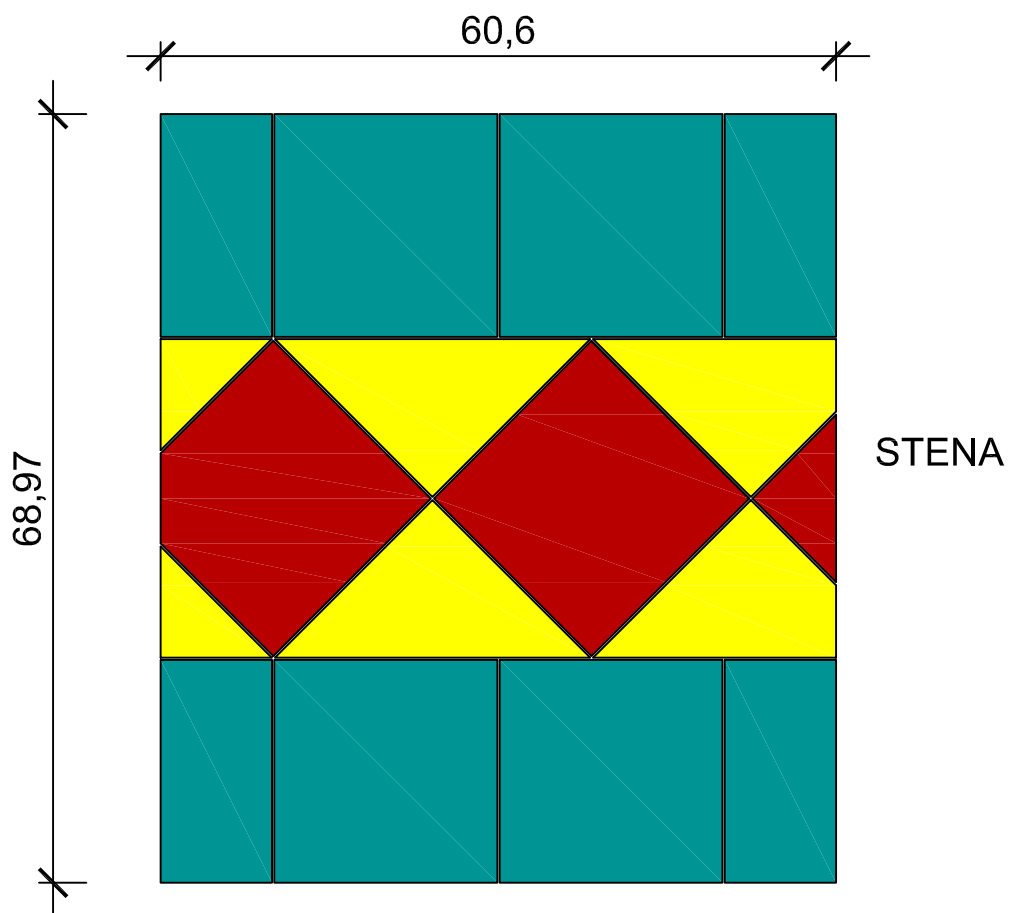

rege 2 mm

DETALJ STIKA STENA - TLA

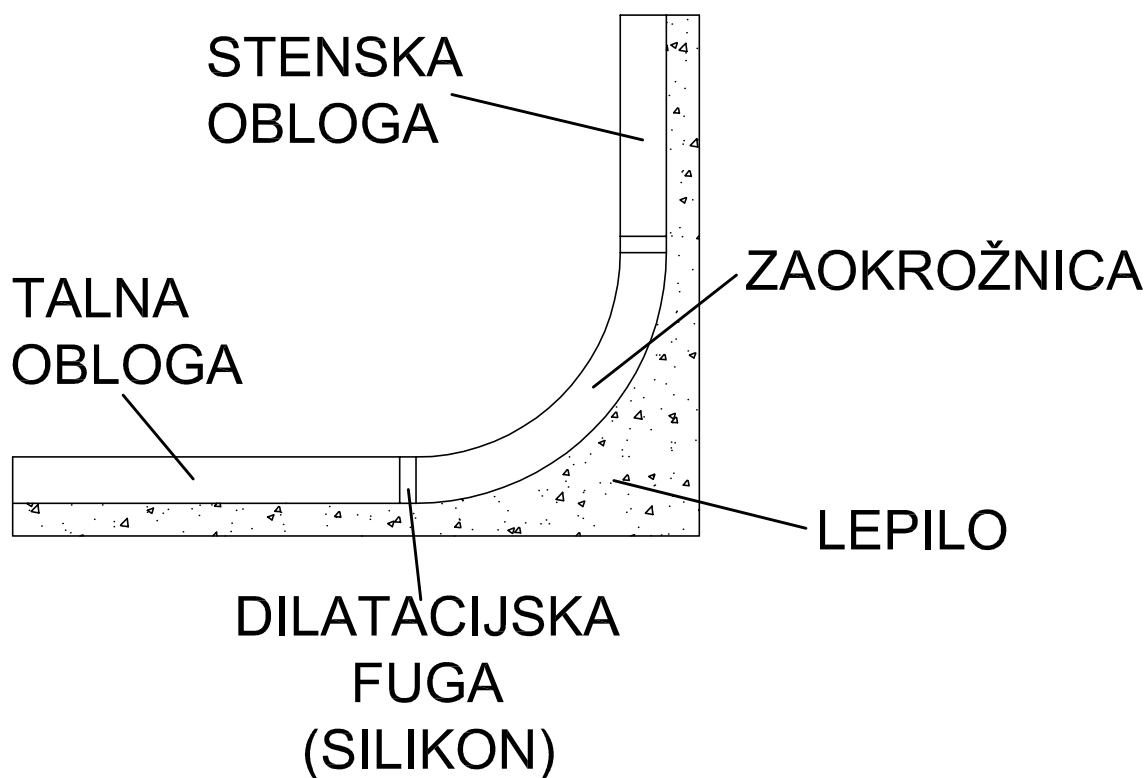

Fugira se samo stenska obloga. Na stiku zaokrožnice in talne keramike se izdelava dilatacijska fuga s silikonom. Talna keramika se samo očisti.
